


8月いっぱいまで工場棟のダイオキシン類の除染作業と外壁部のアスベスト撤去作業が完了しました。9月から現在にかけて工場棟内部の設備機器の解体作業と一部工場棟建屋の解体作業（現場出入口付近）をしております。

10月下旬から本格的に工場棟の建屋解体作業を11月いっぱいまで行っていき、解体の進捗状況に応じて煙突部の除染作業も並行して行う予定です。

また環境測定の方も下図に記載している4カ所にて常時観測し、現場事務所にて監視しています。令和3年9月度までの測定結果は基準値以内でした。詳細な測定結果については柏屋町ホームページをご確認ください。

なお、測定値についてはお手数ですが、現場事務所までお問い合わせ頂ければ常時公表いたします。

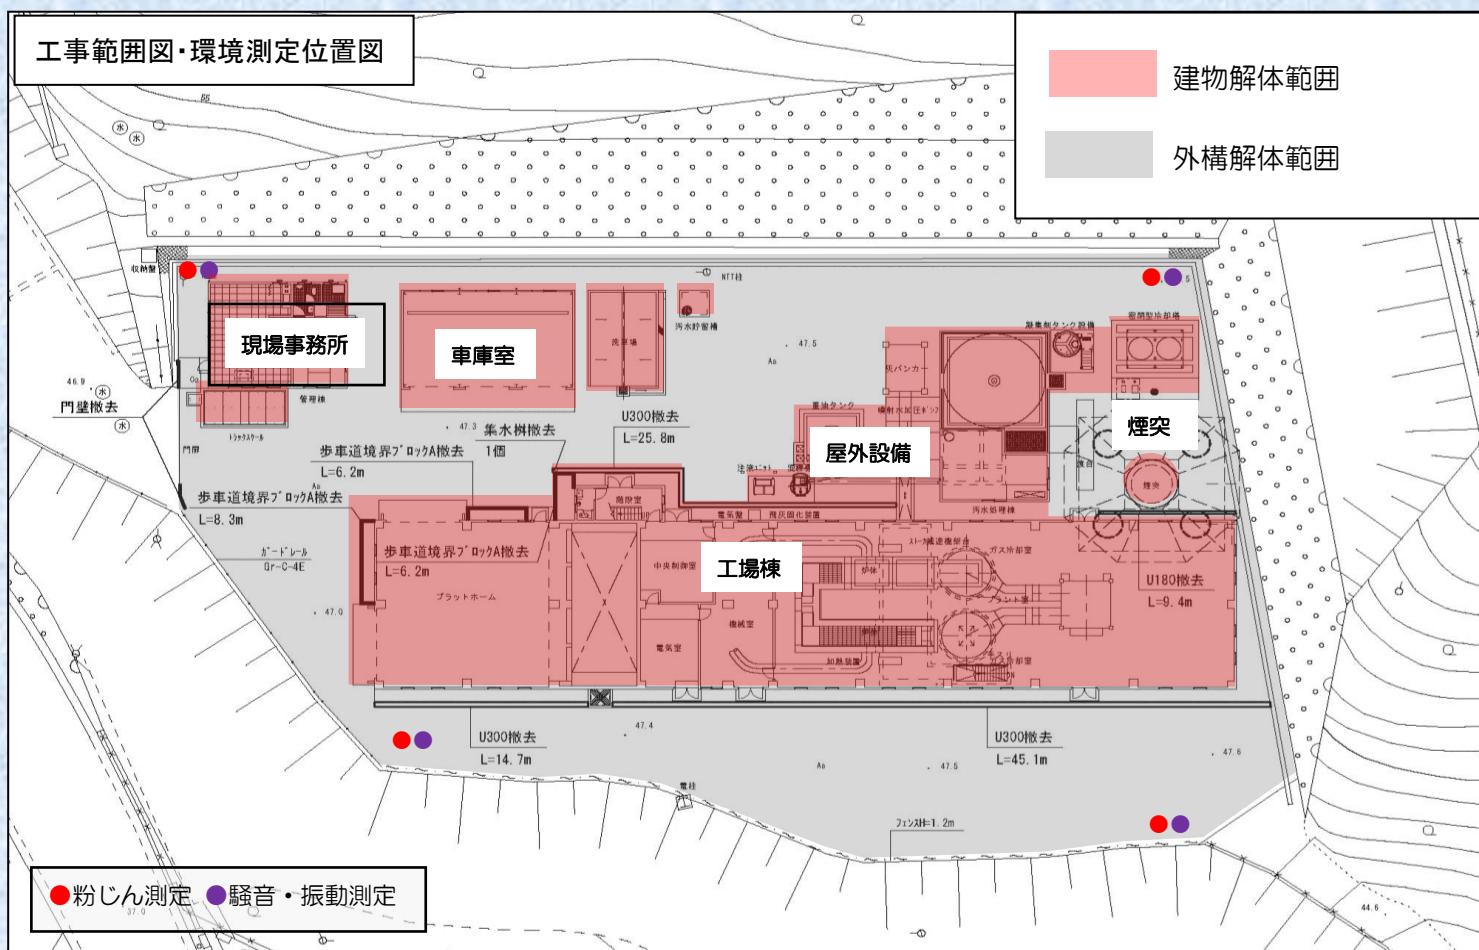

工事作業順序は以下の通りです。現在は【3.解体工事】の段階です。

1.環境対策  
仮設工事


2.ダイオキシン類・  
アスベストの除去工事

3.解体工事

4.土壤汚染  
対策工事

5.解体跡地  
整備工事

## 工事進捗状況（9月）

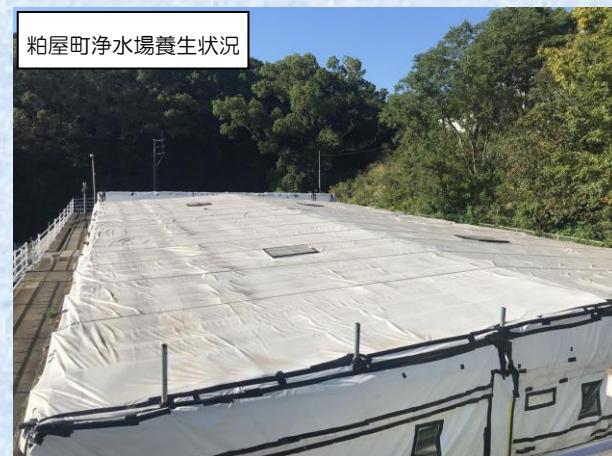

### 作業日及び作業時間

作業は原則として月曜～土曜(祝日含む)とし、日曜日は休工とします。

作業時間は原則として8:00～17:00とさせていただきます。

但し、作業状況により17:00以降に作業させていただく場合がございます。

### 工事に関するお問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは下記担当課へご連絡をお願いします。

<柏屋町役場 道路環境整備課> 連絡先：092-938-0198

<施工者：奥村組・サンコービルド特定建設工事共同企業体 現場代理人：原田>

連絡先：080-1466-3734
