



10月下旬から本格的に工場棟の建屋解体作業を解体の進捗状況に応じて煙突部の除染作業も並行し、11月いっぱいにて完了しています。12月からは、煙突解体工事として特殊な機械や施工方法を用いた煙突内部にあるレンガ解体作業、煙突本体の解体作業を行い、地上部の建物の解体が完了しています。1月から汚染土壌の除去工事を行う予定です。

また環境測定の方も下図に記載している4カ所にて常時観測し、現場事務所にて監視しています。令和3年12月度までの測定結果は基準値以内でした。詳細な測定結果については粕屋町ホームページをご確認ください。

なお、測定値についてはお手数ですが、現場事務所までお問い合わせ頂ければ常時公表いたします。

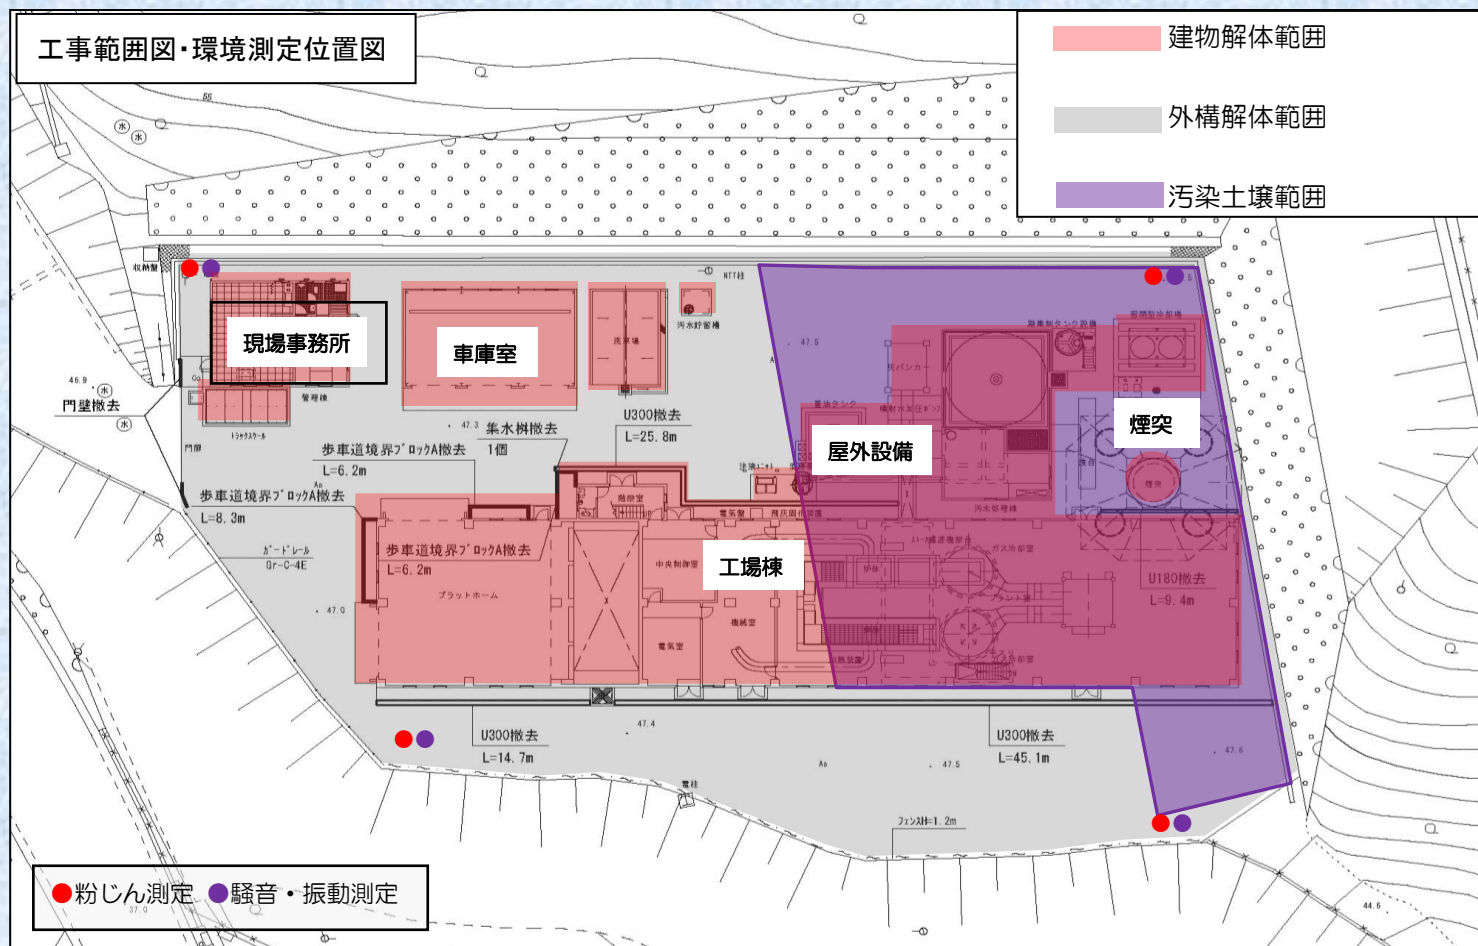

工事作業順序は以下の通りです。現在は【4.汚染土壌対策工事】の段階です。



工事進捗状況（10～12月）

車両出入口



環境測定状況（現場事務所内）



工場棟建屋解体状況



煙突除染状況



煙突レンガ解体状況



煙突解体状況



作業日及び作業時間

作業は原則として月曜～土曜（祝日含む）とし、日曜日は休工とします。
作業時間は原則として8：00～17：00とさせていただきます。
但し、作業状況により17：00以降に作業させていただく場合がございます。

工事に関するお問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは下記担当課へご連絡をお願いします。
＜粕屋町役場 道路環境整備課＞ 連絡先：092-938-0198
＜施工者：奥村組・サンコービルド特定建設工事共同企業体 現場代理人：原田＞
連絡先：080-1466-3734
